



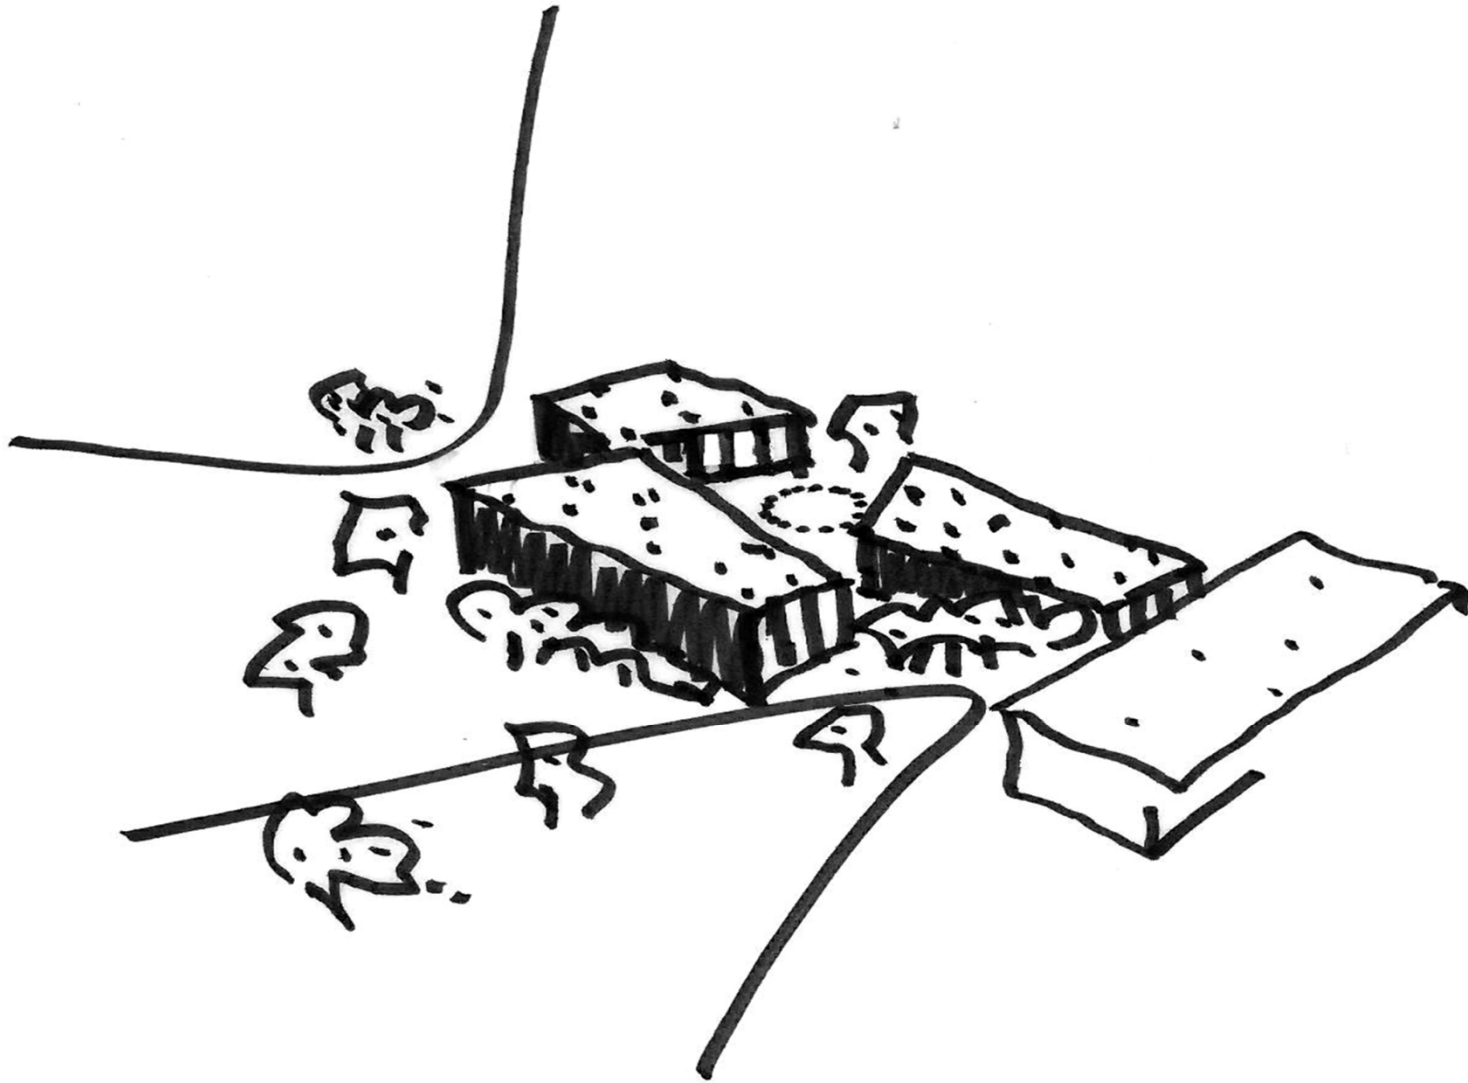


1. Fa. Jokubeit: Streckgitter

→ Beauftragung ist erfolgt, derzeit läuft die W+M Planung seitens Firma

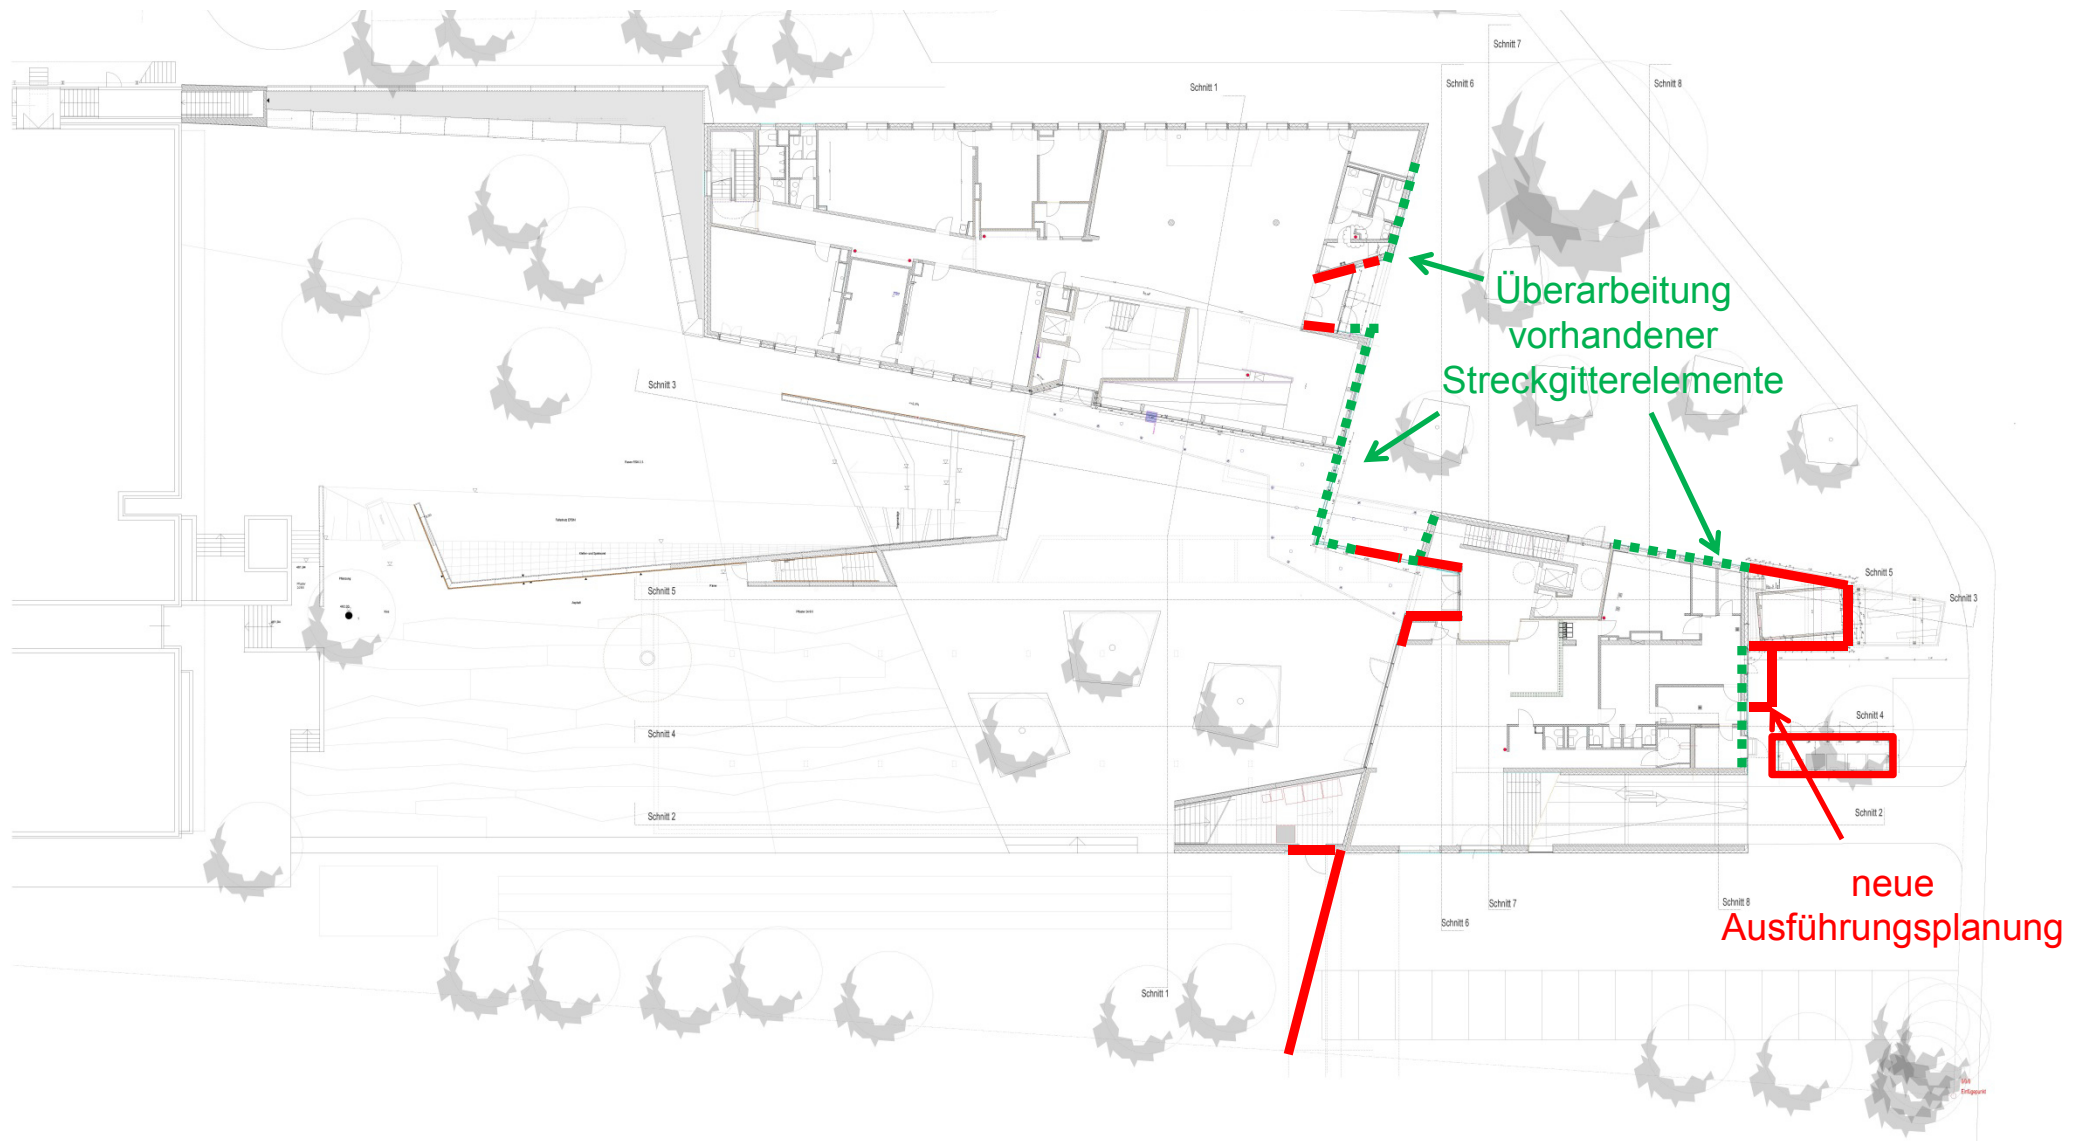




1. Fa. Jokubeit: Streckgitter

→ Beauftragung ist erfolgt, derzeit läuft die W+M Planung seitens Firma

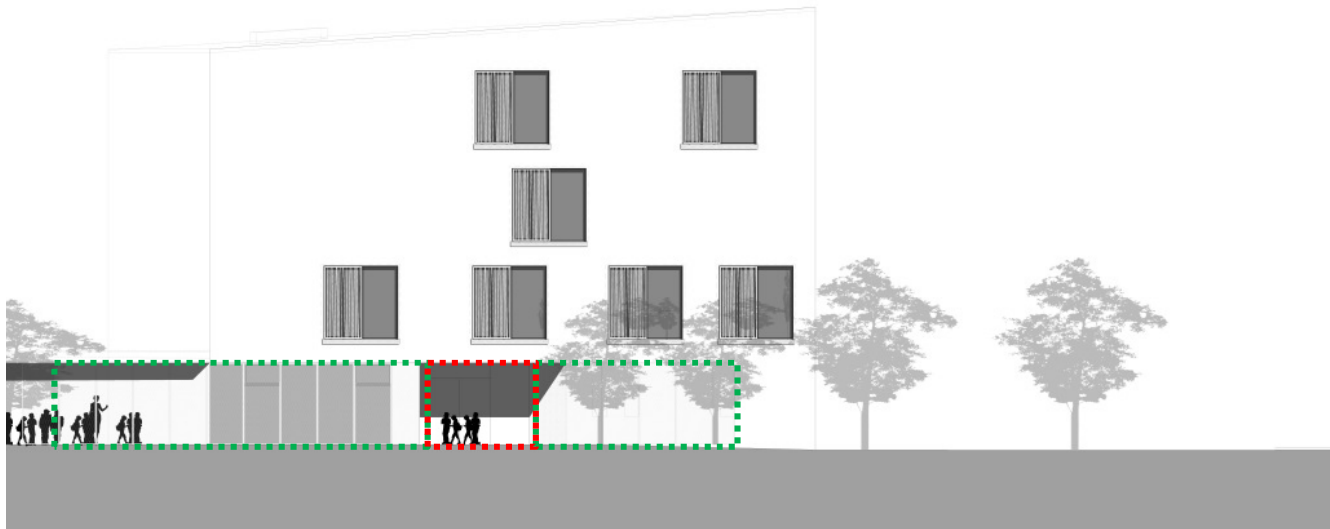





1. Fa. Jokubeit: Streckgitter

→Beauftragung ist erfolgt, derzeit läuft die W+M Planung seitens Firma

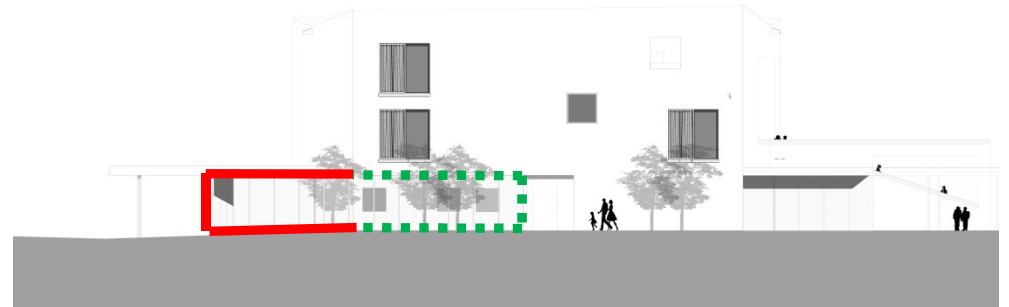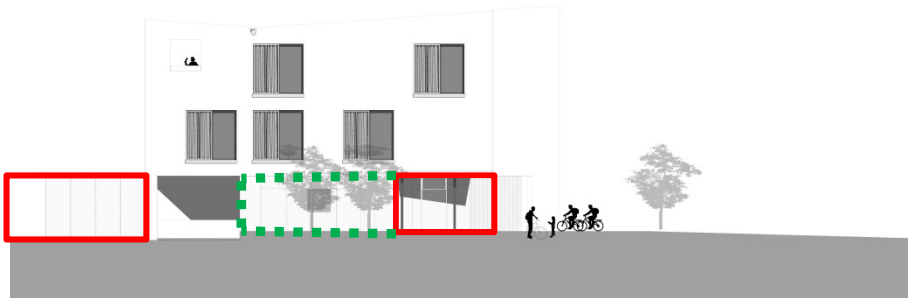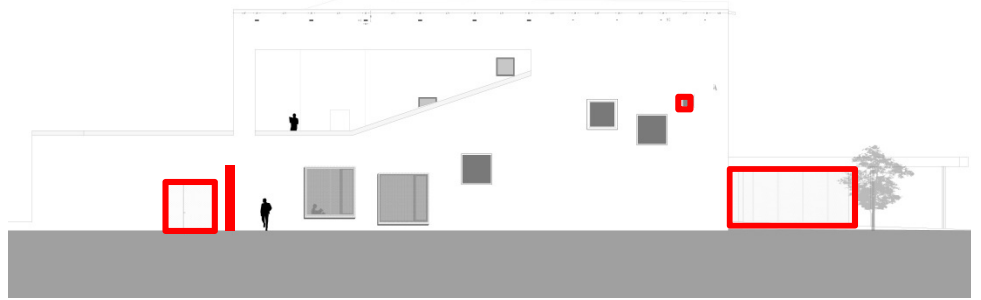


2. Fa. BB Stuck: WDVS

→ Ziel: Mangelbeseitigung bis Schulbeginn 18/19
wird gutachterlich verfolgt

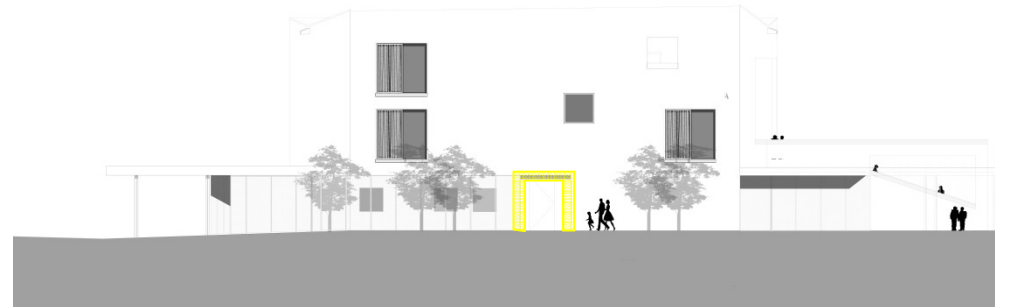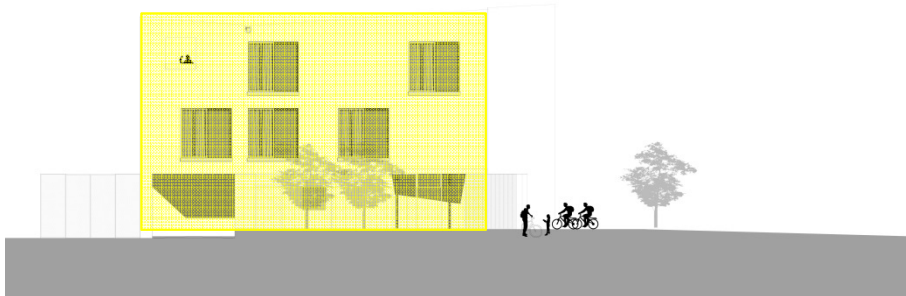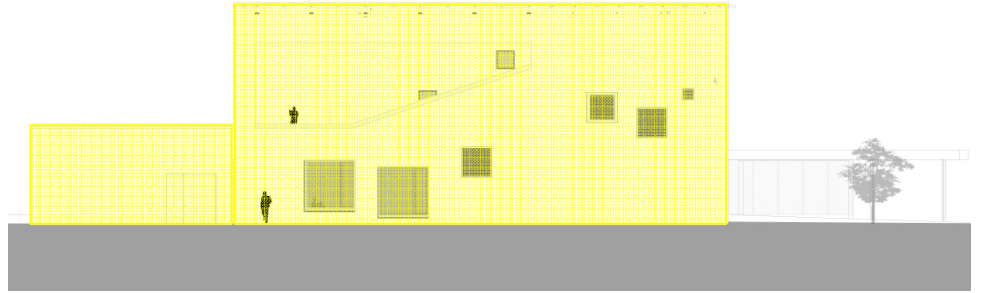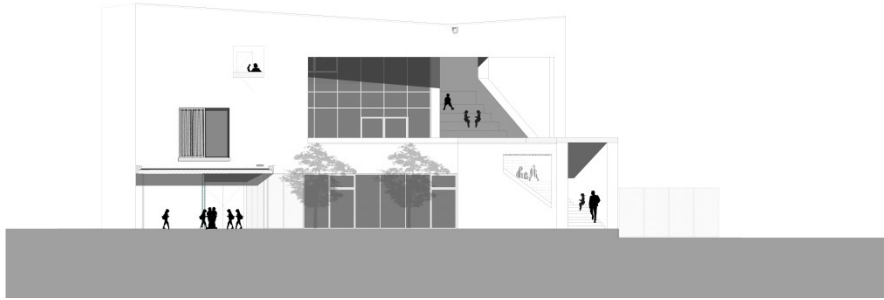

3. Fa. PSH: Schreiner

→ Kündigung erfolgt & Gutachten wurde erstellt, Ersatzvornahme wird in die Wege geleitet

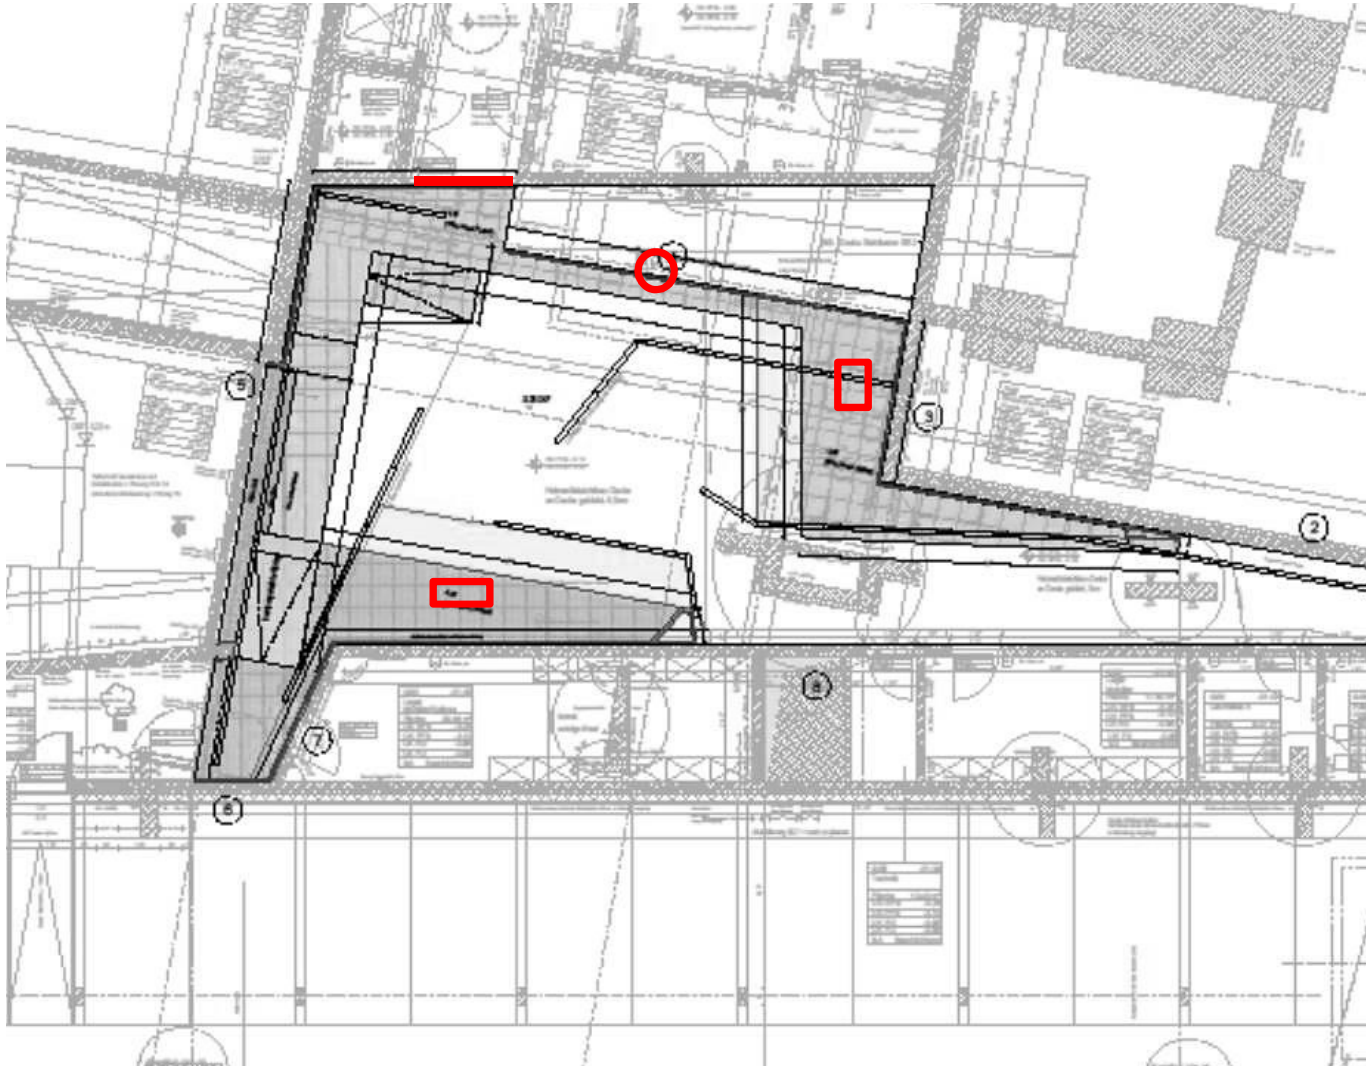

4. Schreinerarbeiten:

A) Firma Flömö

→Ausführung erfolgt in den Sommerferien

auszuführende Leistungen:

- restliche Türstopper montieren
- Ergänzungen der Sockelleisten
- Abkofferung von sichtbaren Kabelführungen
- Türreparatur, Austausch eines Türblattes infolge einer Beschädigung

B) Firma Edlhuber

→Ausführung erfolgt in KW 26 (Ende Juni)

auszuführende Leistungen:

- Zusätzliche Mensagarderobe
- Zusätzliche Lehrerzimmergarderobe
- Fensterbretter in den Fluren der GSII

5. Fa. Design und Color, Malerarbeiten:


→ nach Freigabe des Angebotes,
Ziel: Ausführung in Pfingstferien



- + Lackieren der Brandschutztorclappen in den Fluren der GSII:
- + Herstellen einer PU-Fuge der Eiche Sockelleisten in den Fluren der GS+GT
- + Herstellen einer PU Fuge zw. Innenfassaden bzw. Treppen und mineralischer Bodenbeschichtung
- + sämtliche Ausbesserungen

6. Fa. Bayer: Betonwerkstein

→ Leistung abgenommen;
Mangelbeseitigung ist fast vollständig abgeschlossen

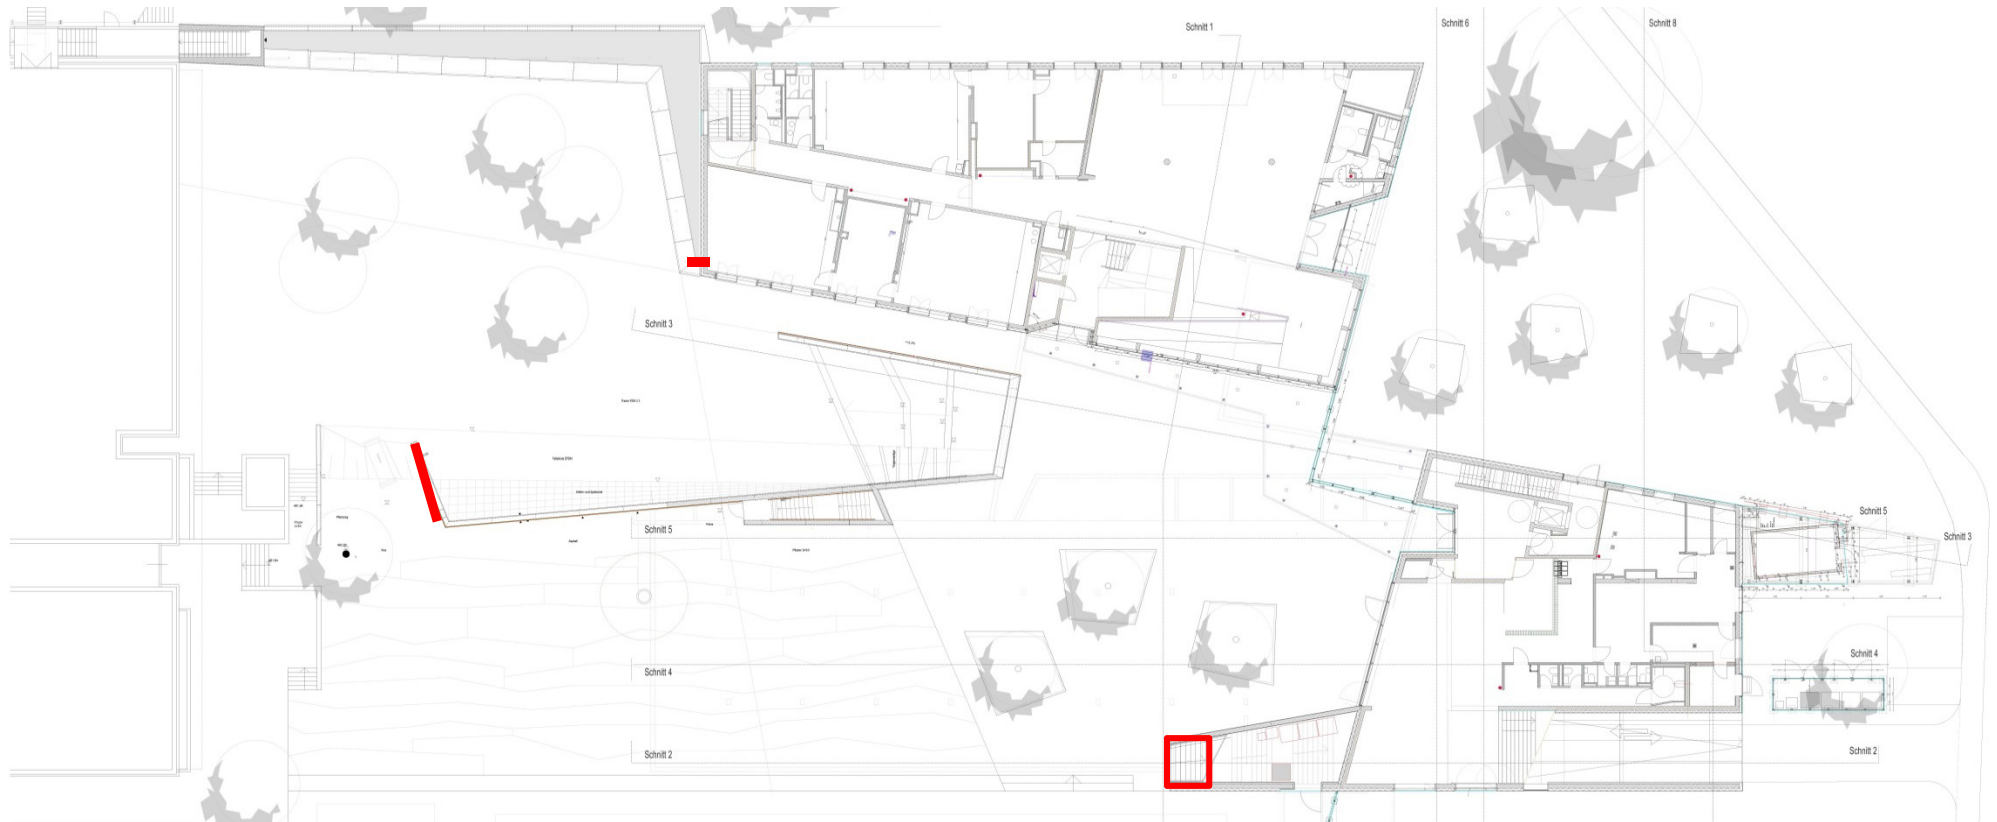

7. Turnhallenverbindungsgang

Beauftragung neuer Trockenbaufirma Heinrich Schmid
→ Ausführung ab KW 23
→ Fa. Bock (Dach) ab KW 20



8. Fa. Maasberg: Vorhang

→ Montage des Bühnenvorhangs und Änderung des Mensavorhanges erfolgt bis Mitte Mai

